

水洗トイレ付図書館建設プロジェクト報告 vol. 8



～建物の完成が近づいてきた季節の変わり目～

自宅で過ごす時間の中、アプリで日本のラジオをよく聴いています。ラジオと言えばリクエスト曲。7月そして8月初旬と日本の夏真ただ中の時は夏を楽しむ曲がリスナーからのリクエストでよくかかっていた。ところが8月も終わりに近づいた頃から夏を懐かしむ曲が多くかかるようになってきました。日本はもう秋の訪れなんだという事をしみじみ思い、またガーナも季節の変わり目という事を雨の降り方で感じるのです。進捗状況の確認も兼ねて村に行こうとした2日(木曜日)は夜明け前から雨が滝のように音をたて朝方まで降り続けました。この日は降ったり止んだりではほぼ一日雨でした。季節の変わり目、この時期の天気予報は連日雷雨です。このプロジェクトは雨期に入った頃に始まり、乾季の訪れる頃に完成引き渡しとなりそうです。乾季の訪れまであと一か月ほどです。




前回7号では、カーペンターがタイルを敷く前のセメントの均し作業を丁寧に行っていた事をお伝えしました。均し終えた後にはシンプルなタイルが敷かれました。玄関ポーチ部分とトイレ内にも丁寧に敷かれました。



トイレに関して今後の作業は水道屋さんが来て下水パイプを取り付ける事と、外にダイジェスタータンクを埋め込む作業があります。

※ダイジェスタータンクが地中に埋め込まれる個所は写真上/下段右写真部分。ブロックは撤去されます。

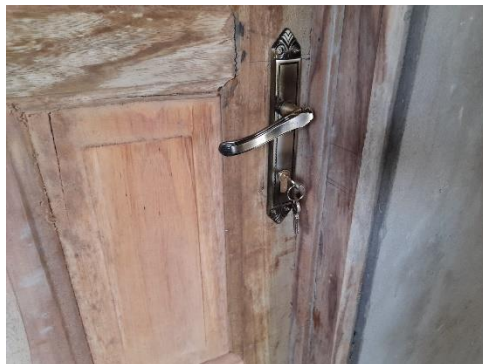

ガーナの新築に於いては欠陥が多々あり、一つ一つ直していくことで快適な生活を送れる住居になると聞いたことがあります。トイレのドアを開けるのにコツが必要で、コツを必要として開けるドアは無いので、コントラクターに直すように伝えました。またこの写真ではトイレのドアにペイントがされていませんが、外壁内壁の塗装作業時にこのドアも塗装される予定です。次回の報告は20日を予定しています。次回、外壁内壁の塗装をお伝えする予定です。

水洗トイレ付図書館建設プロジェクトサポーター 一般社団法人ギブアウェイ様
